CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

version
28 juillet 2017

N°	Nom de la tâche
1	
2	**TRIBUNE NORD**
3	**TERRASSEMENT**
4	plateforme bât et voirie
5	réseaux principaux humides et secs
6	cana EP dia 600 mm au droit du portail
7	réseau alim élec transfo
8	branchements réseaux sorties bat
9	clotures et portails
10	réglages et bordures
11	revêtements de surfaces
12	marquages
13	pelouse
14	
15	**GROS ŒUVRE**
16	implantation
17	semelles isolées et filantes
18	**blocs 5-6-7 et 2-3-4**
19	réseaux sous dallage
20	réglages
21	fondation et muret bar
22	bêche antigel
23	SF 4 et muret File B
24	ferraillage et coulage radier
25	montage agglos
26	enduits monocouche sur agglos
27	enduit ciment intérieur buvette
28	
29	**blocs 1**
30	réseaux sous dallage
31	réglages
32	SF 4/5 et longrines files B et C
33	bêche antigel
34	fin fondations et muret zone PMR
35	ferraillage et coulage radier
36	montage agglos
37	fondations sous murs BA
38	murs BA Bodéga
39	dallage bodéga
40	séchage et protection dallage
41	enduit monocouche sur ext sur agglos
42	enduit monocouche ext sur BA
43	étaiement et coulage plancher collaborant
44	coulage plancher collaborant
45	enlèvement des étais
46	réglage et dallage zone PMR
47	rampes et dallage PMR
48	tirants du parvis
49	seuils, appuis
50	résine de sol
51	
52	**CHARP METAL COUV BARD**
53	montage charpente tribune
54	charpente Bodéga
55	pose bacs collaborants
56	pose des filets de chantier
57	couverture tribune
58	hors d'eau tribune
59	couverture Bodéga
60	hors d'eau Bodéga
61	pose des filets anti pigeons
62	pose des DEP tribune
63	pose des DEP Bodéga
64	
65	bardage file B
66	bandeau bardage nord et pignons
67	bandeau bardage sud
68	toile pignons

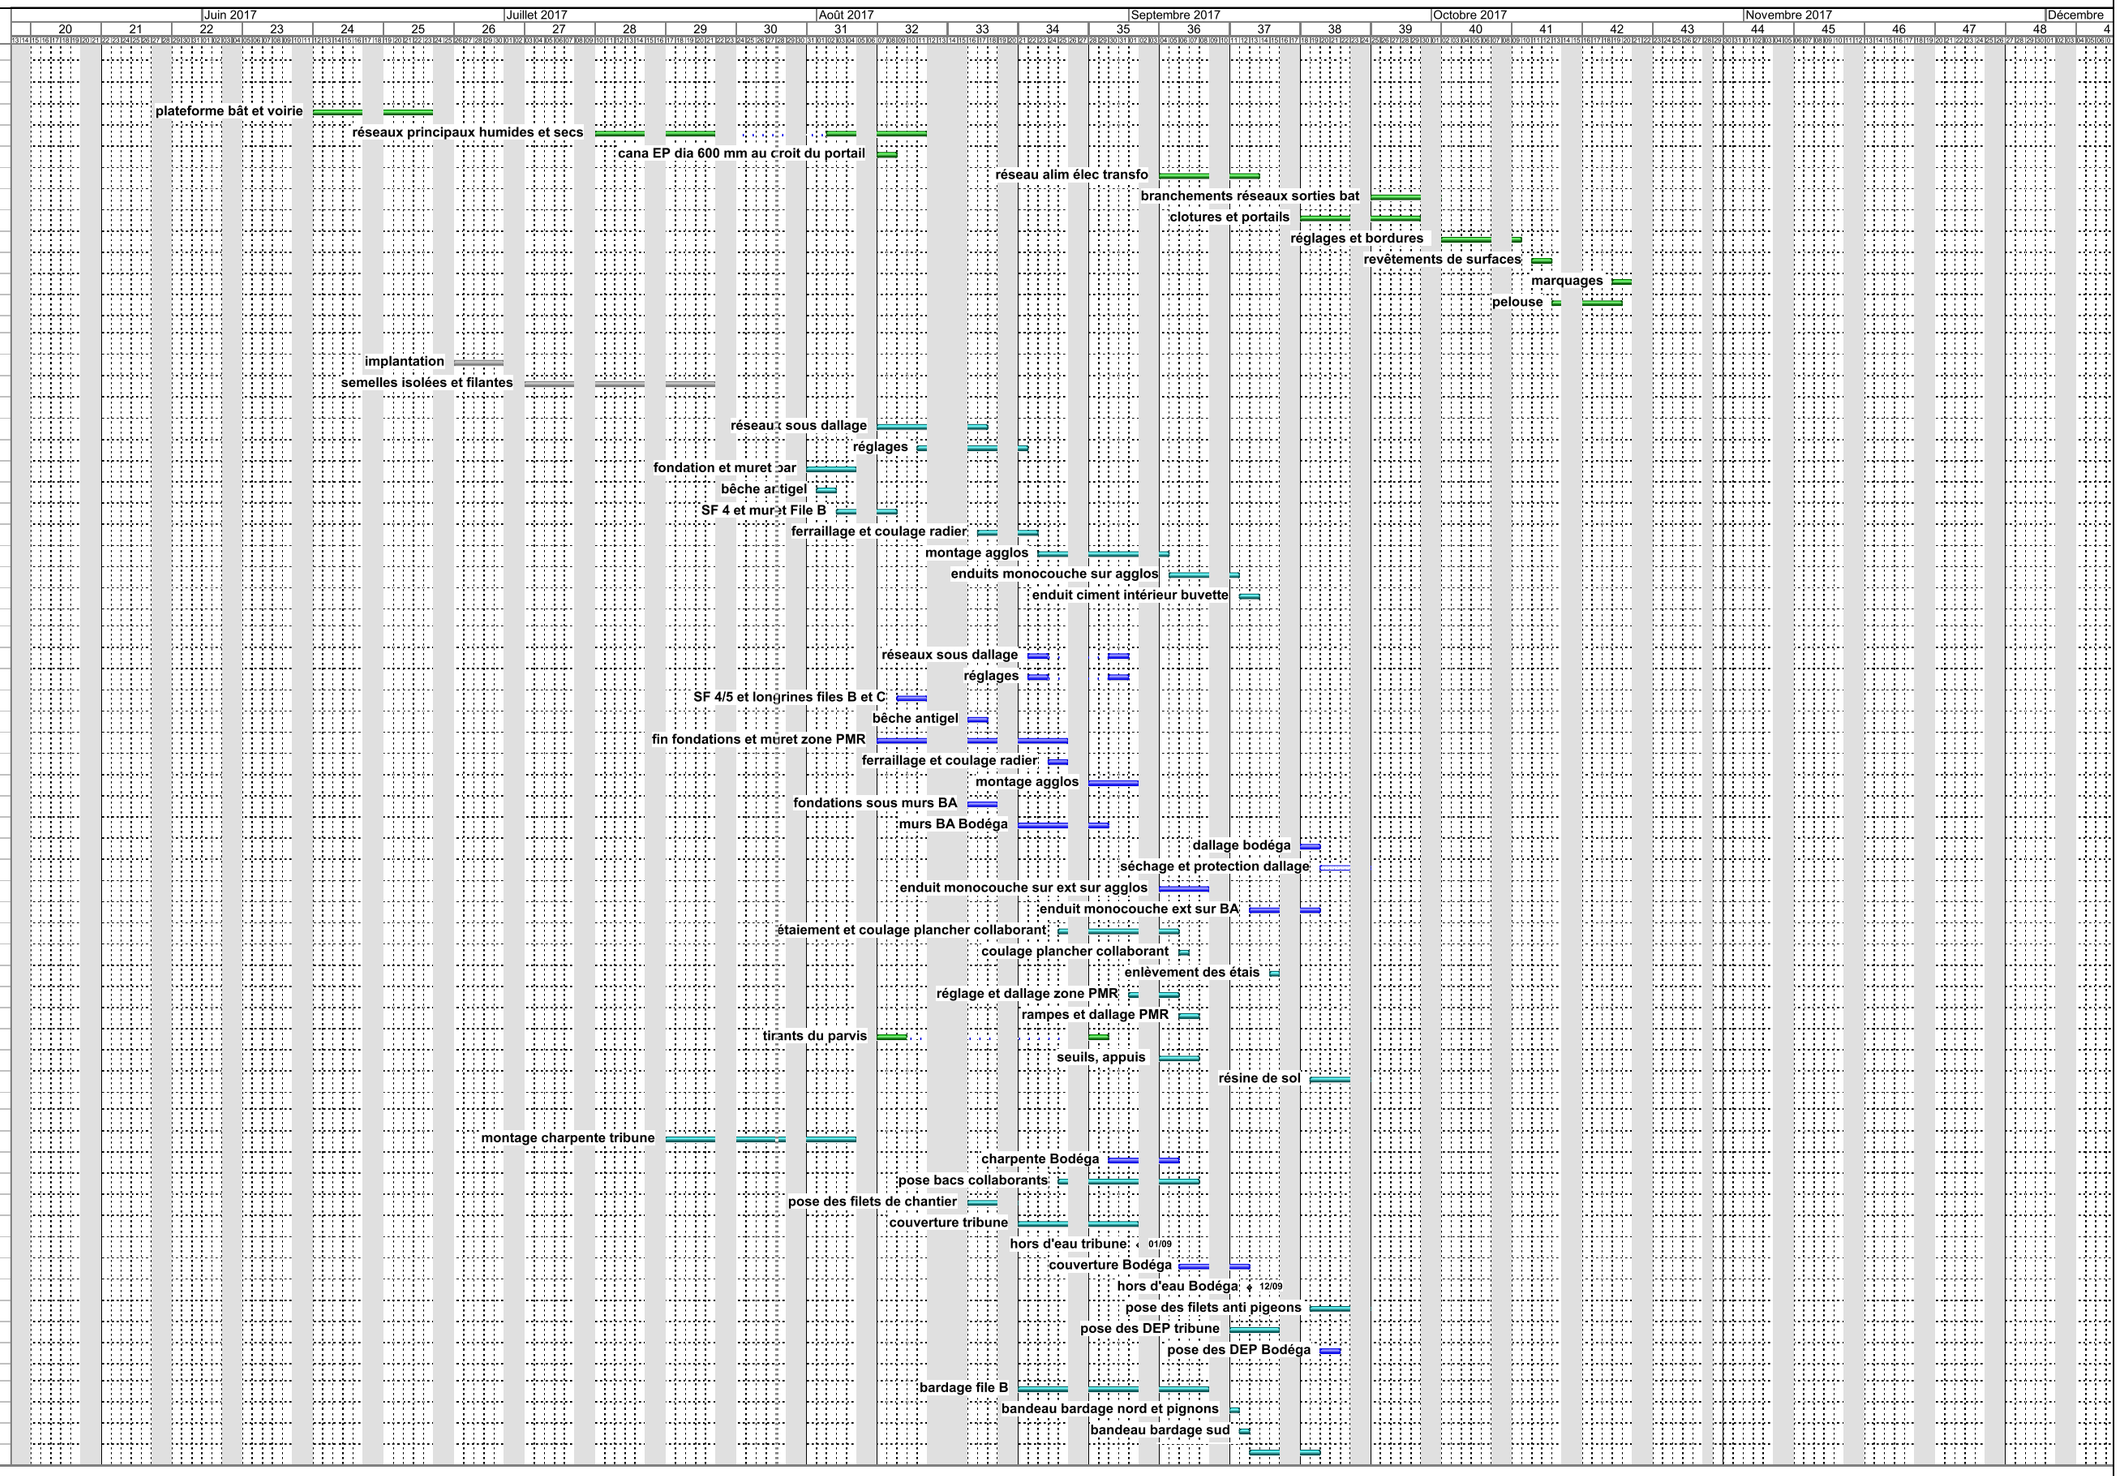

CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

version
28 juillet 2017

N°	Nom de la tâche
69	**MENUISERIE EXT ALU**
70	pose des menuiseries alu
71	hors d'air
72	
73	**METALLERIE**
74	pose des portes métalliques
75	garde corps tribune zone PMR
76	
77	**TRIBUNES MODULAIRES**
78	montage tribunes
79	
80	**MENUISERIE INTERIEURE BOIS**
81	pose des cadres de portes bodega
82	pose des cadres de porte sanit
83	plinthes et portes à peindre bodéga
84	cimaises bodega
85	cloisons strat massif
86	portes strat
87	meuble bar et étagères bodéga
88	meuble bar buvette
89	paillasse infirmerie
90	
91	**FLOCAGES**
92	flocage blocs 2-3-4
93	flocage bloc 1 Rgt
94	flocage bloc 1 Bodéga
95	flocage blocs 5-6-7
96	
97	**PLATRERIE**
98	plafond placo bodéga
99	doublages stil bodéga
100	caissons placo bodéga
101	cloisons carrobric sanit bloc 3
102	cloisons carrobric sanit blocs 2 et 4
103	cloisons doublages bloc 5
104	caissons placo locaux techn
105	
106	**PEINTURE**
107	peinture bodéga
108	propreté locaux tech
109	nettoyage fin de chantier
110	
111	**PLAFOND SUSPENDU**
112	suspentes sous plancher
113	ossature et plaques bloc 1
114	ossature et plaques blocs 2-3-4
115	ossature et plaques blocs 5 et 7
116	
117	**CARRELAGE**
118	carrelage sol et murs bloc 2
119	carrelage sol murs bloc 3
120	carrelage sols murs bloc 4
121	carrelage infirmerie
122	

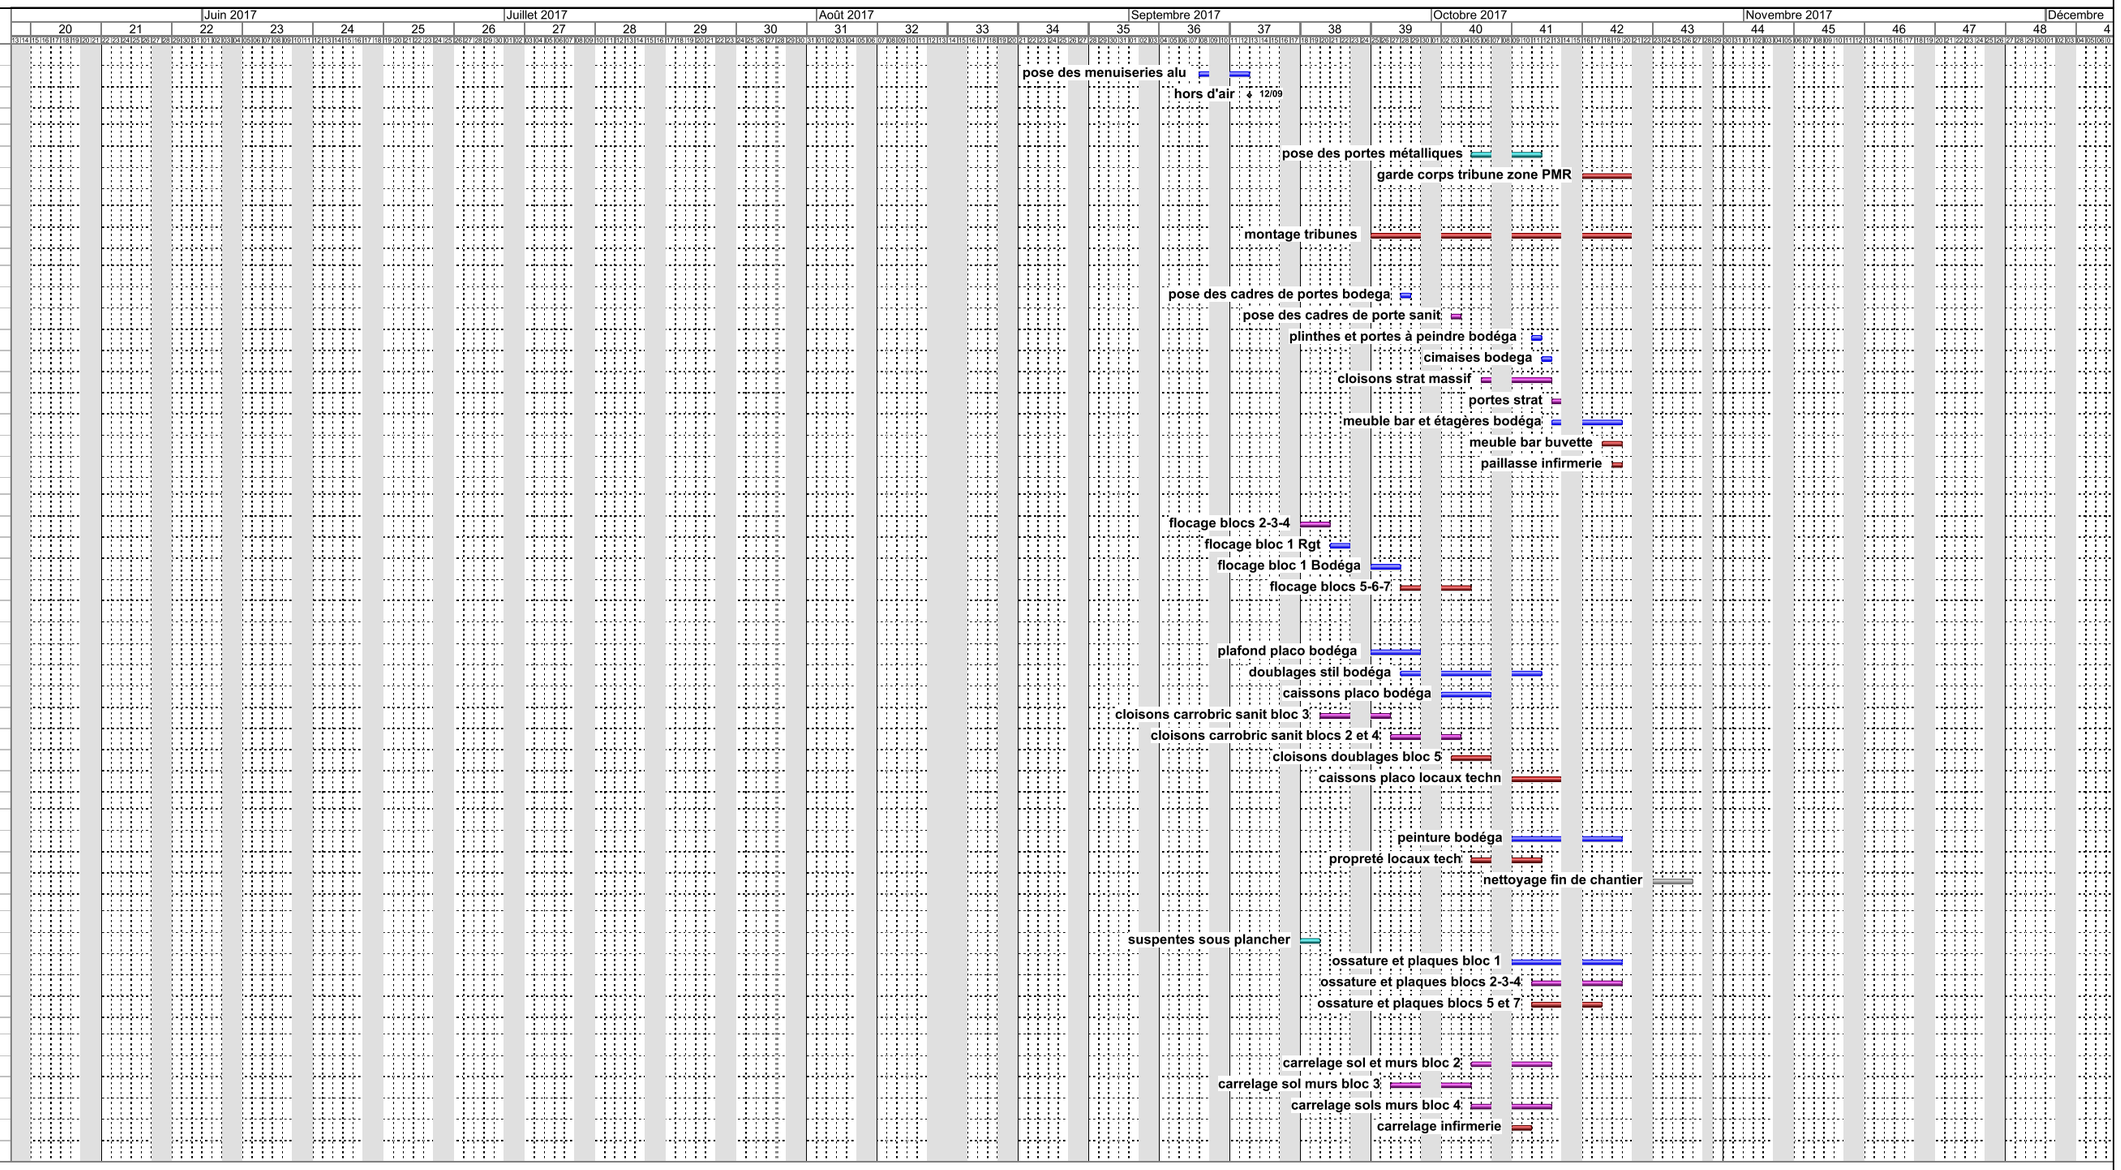

CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

version
28 juillet 2017

N°	Nom de la tâche
123	**ELECTRICITE**
124	Nouvelle alim générale
125	livraison et raccord TGBT
126	**TRIBUNE**
127	liaisons équip
128	chemins de cables sous tribune
129	cablages CF cf sous tribune
130	appareillages sous tribune
131	projos sur toit terrain d'honneur
132	projos terrain annexe
133	transfert des caméras
134	rubans leds
135	
136	**AUTRES LOCAUX**
137	incorpos
138	suspentes sous plancher
139	cablages
140	appareillages
141	essais
142	
143	**PLOMB - SANIT - CHAUFFAGE - VENTIL**
144	pose PE AEP
145	pose cana réseau chaleur
146	réseaux sous dallage
147	suspentes sous plancher
148	canas plomb après cloisons blocs 2-3-4
149	pose des bâtis supports bloc 3
150	pose des bâtis supports blocs 2 et 4
151	canas plomb après carr blocs 2-3-4
152	canas chauf en plénum bloc 1
153	calo des cana chauf en plénum
154	cassettes en plaf bloc 1
155	clim LT
156	
157	gaines en plénum bloc 1
158	gaines en plénum blocs 2-3-4
159	gaines en plénum blocs 5-6-7
160	pose et raccord hottes
161	
162	appareillage sanitaire
163	calo des cana ECS
164	extincteurs + plans evac
165	
166	**MATCH FCBP ou USBPA**
167	match FCBP du 4 août
168	match FCBP du 8 août
169	match FCBP du 25 août
170	match USBPA du 1er septembre
171	match FCBP du 15 septembre
172	match FCBP du 22 septembre
173	match FCBP du 13 octobre
174	match USBPA du 14 octobre
175	match FCBP du 27 octobre
176	match USBPA du 29 octobre
177	
178	LIVRAISON TRIBUNE
179	OPR
180	commission de sécurité
181	

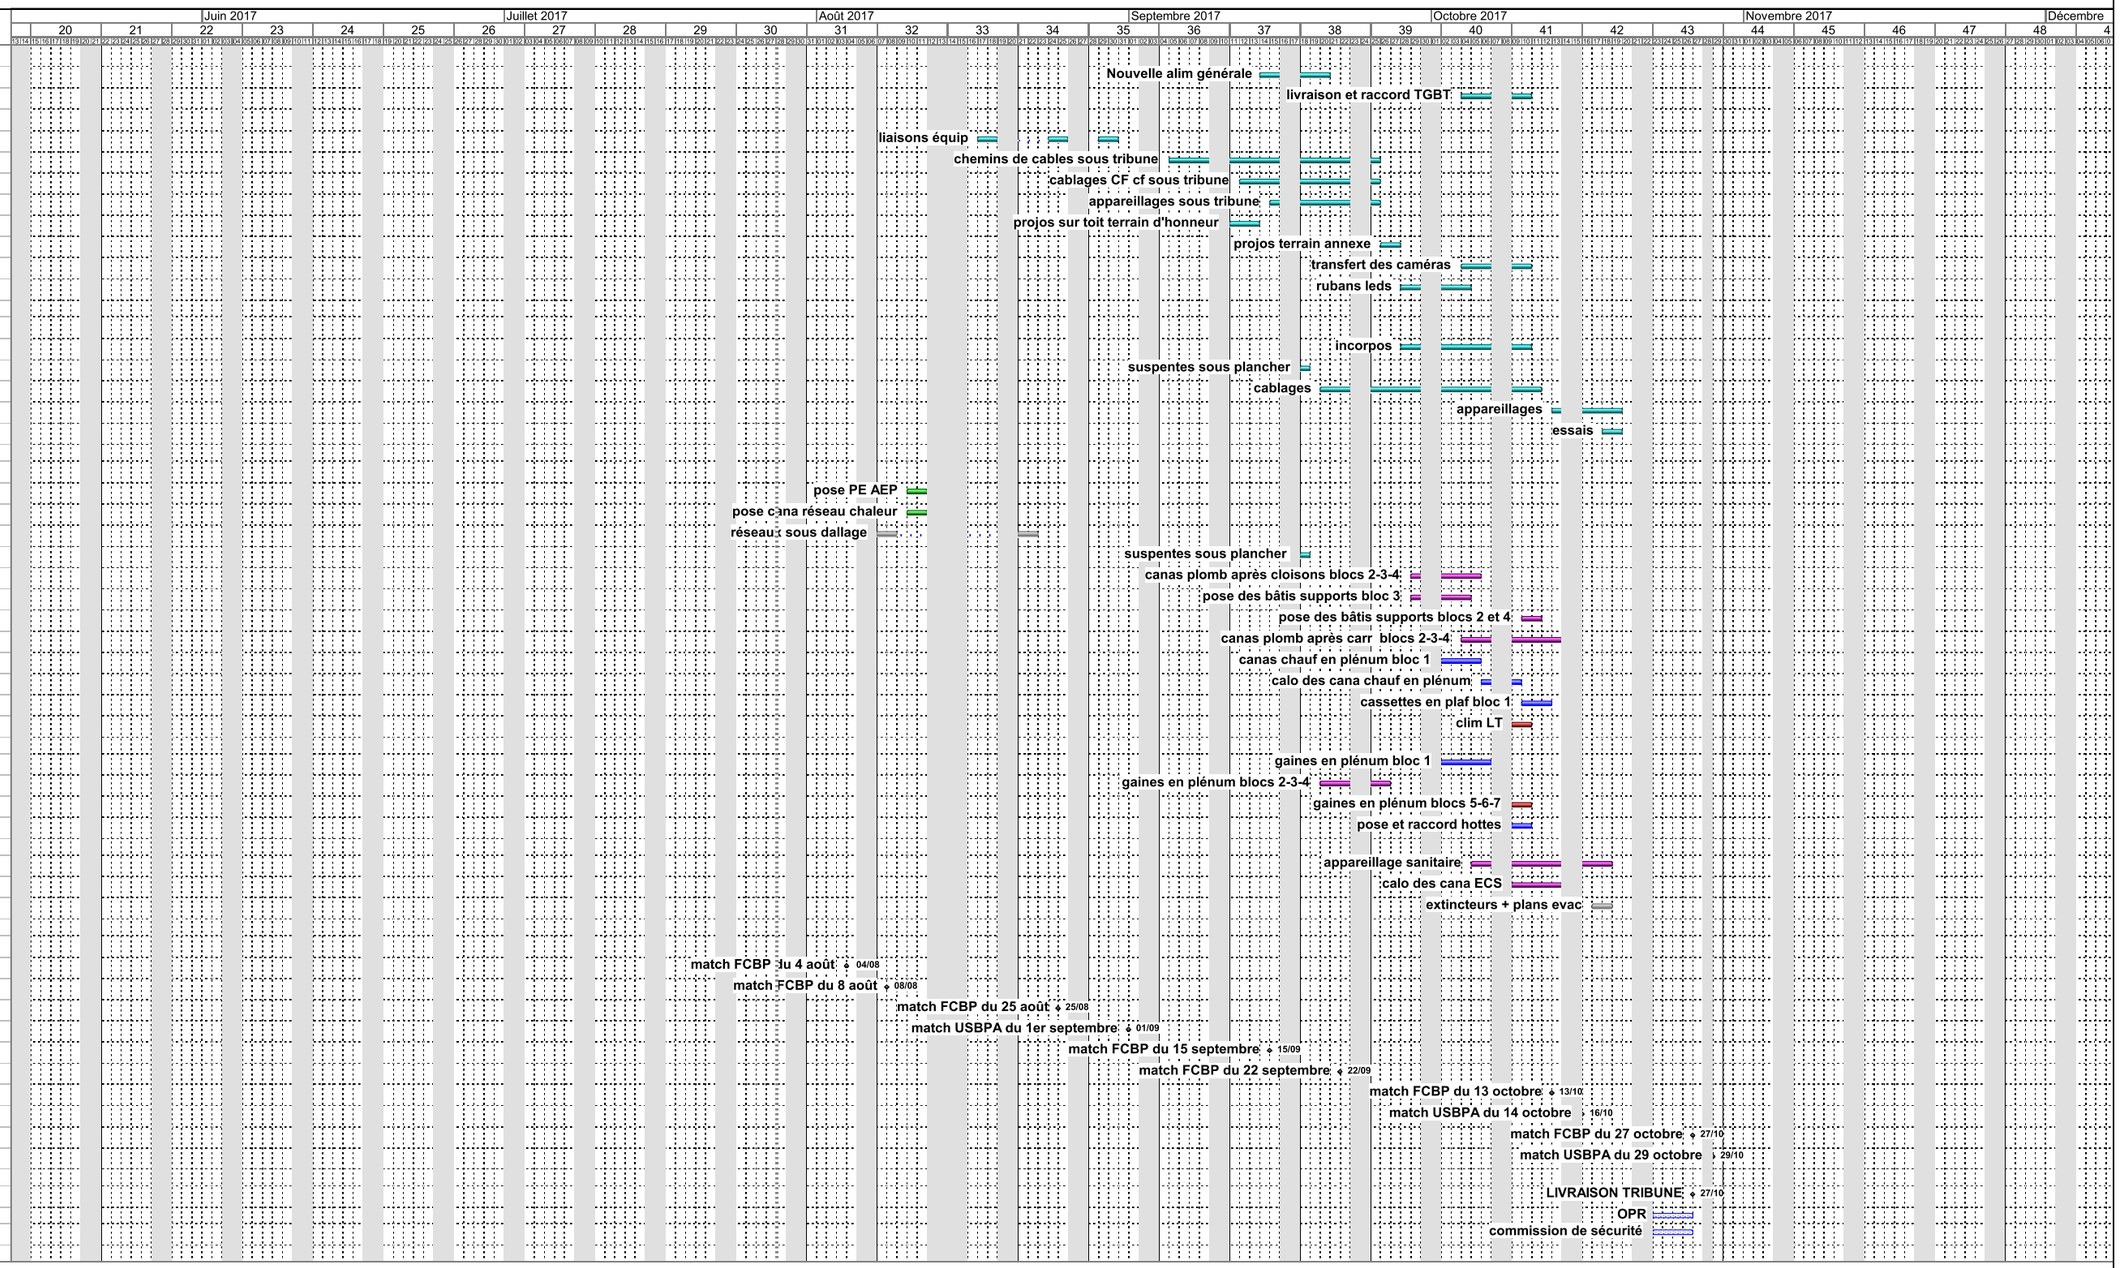

CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

version
28 juillet 2017
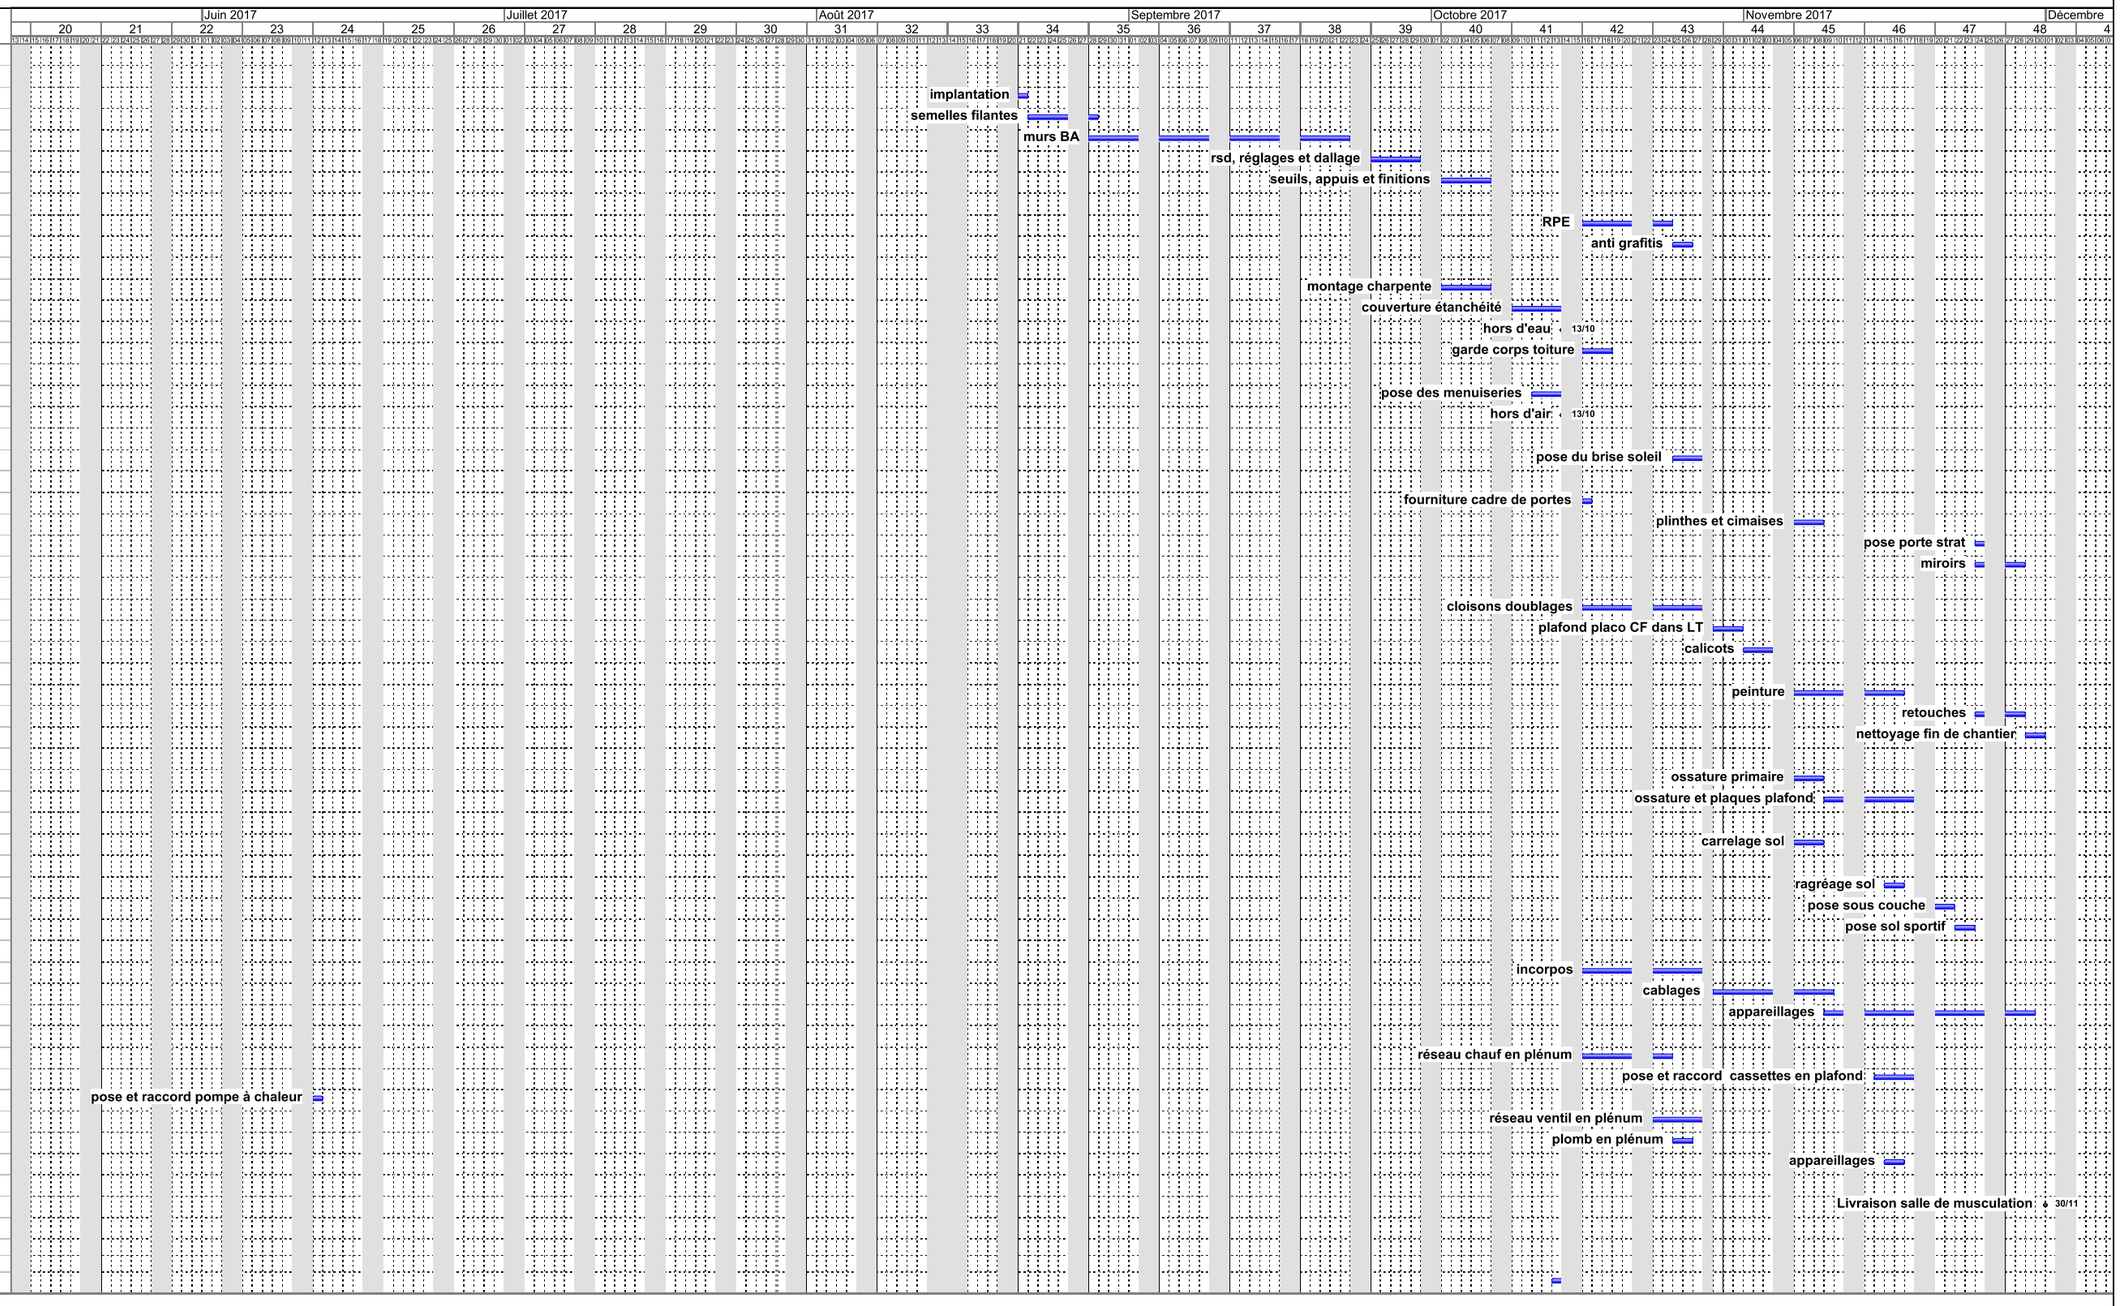
N°	Nom de la tâche
182	**SALLE MUSCULATION**
183	**GROS ŒUVRE**
184	implantation
185	semelles filantes
186	murs BA
187	rsd, réglages et dallage
188	seuils, appuis et finitions
189	**FACADES**
190	RPE
191	anti grafitis
192	**CHARP METAL COUV BARD**
193	montage charpente
194	couverture étanchéité
195	hors d'eau
196	garde corps toiture
197	**MENUIS EXT ALU**
198	pose des menuiseries
199	hors d'air
200	**METALLERIE**
201	pose du brise soleil
202	**MENUISERIE INT BOIS**
203	fourniture cadre de portes
204	plinthes et cimaises
205	pose porte strat
206	miroirs
207	**PLATRERIE**
208	cloisons doublages
209	plafond placo CF dans LT
210	calicots
211	**PEINTURE**
212	peinture
213	retouches
214	nettoyage fin de chantier
215	**PLAFOND SUSPENDU**
216	ossature primaire
217	ossature et plaques plafond
218	**CARRELAGE**
219	carrelage sol
220	**SOL SOUPLE**
221	ragréage sol
222	pose sous couche
223	pose sol sportif
224	**ELECTRICITE**
225	incorpos
226	cablages
227	appareillages
228	**CHAUF VENTIL PLOMB**
229	réseau chauf en plénum
230	pose et raccord cassettes en plafond
231	pose et raccord pompe à chaleur
232	réseau ventil en plénum
233	plomb en plénum
234	appareillages
235	**LIVRAISON**
236	Livraison salle de musculation
237	.
238	
239	
240
